

INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. (JUNIO 2015).



Dado el ánimo por realizar el correcto ejercicio y gestión en este mes de Mayo del 2015 y refiriéndonos a la partida del Fortalecimiento de los Municipios, el **Departamento de Proyectos** con la Delegación de la SEDATU del estado en la modalidad de Mejoramiento Físico, continuamos la propuesta de los espacios públicos a intervenir por el Programa de Rescate de Espacios Públicos **2015**; de los cuales informo que solo se aprobó uno de ellos que es: la **segunda etapa** de consolidación del parque **Álvaro Obregón** y que actualmente está en etapa de revisiones de presupuesto y proyecto en las oficinas de la capital del estado, para poder dar seguimiento a lo correspondiente a su licitación pública

**INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. (JUNIO 2015).**



Ilustración 1.- Parque Álvaro Obregón cancha propuesta a colocar techumbre.

- **Parque Álvaro Obregón,** terminado al 100%
- **Validando la propuesta de consolidación para 2015** de colocación de alumbrado de las canchas y la techumbre de la cancha de fútbol rápido.

**INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. (JUNIO 2015).**



Ilustración 1.- C.E.C.A.T.I.

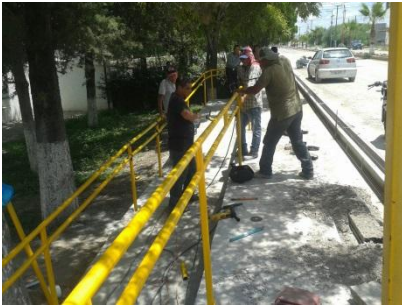


Ilustración 2.- D.I.F.



Ilustración 3.- D.I.F.

- **Rampas en centros escolares, en proceso a un 90%**
- **Avance físico al 90% y 20% financiero.** Se continúa con la **construcción de rampas en diferentes centros escolares** da la fecha culminadas al 95% en 8 escuelas y edificio del D.I.F; en proceso la escuela secundaria Francisco Zarco y en proceso de terminar de acuerdo a calendario; el porcentaje pendiente es en concepto de pintura de logo horizontal.

**INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. (JUNIO 2015).**

TABLA 1 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN PARA ESTE EJERCICIO FISCAL.

ACCIÓN (obras)	RESULTADOS	ESPECIFICACIÓN	LOCALIZACIÓN	BENEFICIADOS	FINANCIAMIENTO	COSTO DE LA ACCIÓN
CONSTRUCCION DE RAMPAS EN EDIFICIO DEL DIF Y CENTROS ESCOLARES	Trabajando en centros escolares en construcción de rampas de 9 centros escolares-	Se han terminado al 100% los trabajos de construcción, de rampas al 100% en 8 centros escolares y una actualmente en proceso	En cabecera Municipal, zona urbana.	23 850 personas	F.A.F.M. \$ 450,000.00	\$ 450,000.00
REHABILITACIÓN DEL PARQUE ÁLVARO OBREGÓN	Intervención en el área de las canchas de basquetbol.	Área permeable, verde, reforestación, techumbre, rampa para personas con discapacidad, rotulación, pintura, botes separadores de basura, murete, placa y señalización.	Col. Centro, en la Cabecera Municipal Matehuala, S.L.P.	3005 personas	Federal: \$1,276,014.00 Municipal: \$1,001,783.17	\$ 2,277,799.17

**INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. (JUNIO 2015).**

TABLA 1.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE PROYECTOS

ACTIVIDADES	CONCEPTO	COMENTARIO
SEGUIMIENTO A PROPUESTA DE CONSTRUCCION DE ALBERGUE MUNICIPAL EN HOSPITAL GENERAL.	SEGUIMIENTO A LA ELABORACION DE PROYECTO PRESENTADO A RAMO 33 POR PARTE DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MATEHUALA.	SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO Y EN ESPERA DE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA JURISDICCION SANITARIA
PROPUESTA DE PROYECTO DE SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE ALVARO OBREGON	LA ENTREGA DE PROPUESTA DEL PROYECTO DEL PARQUE ÁLVARO OBREGÓN PARA SU CONSOLIDACION EN SEGUNDA ETAPA PARA 2015.	SE ESTA EN ESPERA DE LA AUTORIZACION , POR PARTE DE LA SEDATU DEL ESTADO
CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA LAS ESCUELAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	EN ESTA FECHA INICIAMOS CONSTRUCCION DE RAMPAS EN APOYO DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA DEFERENTES ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	APOYO INTER DEPARTAMENTAL DEL RAMO 33.
APOYO A DEPARTAMENTOS DENTRO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	CONTINUAMOS CON SEGUIMIENTO DE PROYECTO EJECUTIVO DEL LIENZO CHARO PARA LLEVAR A EFECTO SU LICITACION AL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE PROYECTOS Y ENLACE	APOYO INTER DEPARTAMENTAL DEL RAMO 33.

**INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. (JUNIO 2015).**

ACTIVIDADES	CONCEPTO	COMENTARIO
APOYO A OTRO DEPARTAMENTOS Y/O INSTANCIAS.	AL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICAS SE APOYO EN IMPRESIÓN DE PLANOS.	APOYO INTER INSTANCIAS MUNICIPALES E INTERNO.
APOYO A DEPARTAMENTOS DENTRO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	CONTINUAMOS CON SEGUIMIENTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CASA DE CULTURA PONIENTE PARA LLEVAR A EFECTO SU LICITACION AL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE PROYECTOS Y ENLACE.	APOYO INTER DEPARTAMENTAL DEL RAMO 33.
APOYO A DEPARTAMENTOS DENTRO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	CONTINUAMOS CON SEGUIMIENTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CASA DE CULTURA PONIENTE PARA LLEVAR A EFECTO SU LICITACION AL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE PROYECTOS Y ENLACE	APOYO INTER DEPARTAMENTAL DEL RAMO 33.
